

PREHLAD VYKONANÝCH PRÁC V ROKU 2023


Číslo zmluvy: **MK-14/2023-323/9780**
NP: **Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva (NP Ľudia a hrady)**
NKP: **Hrad Muráň**
Obdobie realizácie: **22.05.2023 - 31.12.2023**

Na základe pridelenej dotácie z Ministerstva kultúry SR, sa obec v roku 2023 zapojila do Národného projektu **Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva (NP Ľudia a hrady)**. Zamestnaných bolo dvadsať pracovníkov, z toho 2 majstri, 2 koordinátori, 10 samostatných a 6 pomocných pracovníkov. Projekt bol realizovaný 8 mesiacov (od 22. mája 2023 do 31. decembra 2023).

Dom veliteľa


Okno domu veliteľa - južné priečelie

Na južnom priečelí sa premurovali zdegradované časti a doplnená bola staticky narušená klenba a pohľadová stena. Taktiež bol doplnený ručne tesaný okenný preklad. Osadili sa dubové šambrány ďalšieho okna na južnej stene a doplnil sa okenný záklenok. Na danom úseku bola nevyhnutná aj stavba úsekov lešenia okolo celej budovy z dôvodu pomurovania pomurníc osadeného krovu a domurovanie koruny.

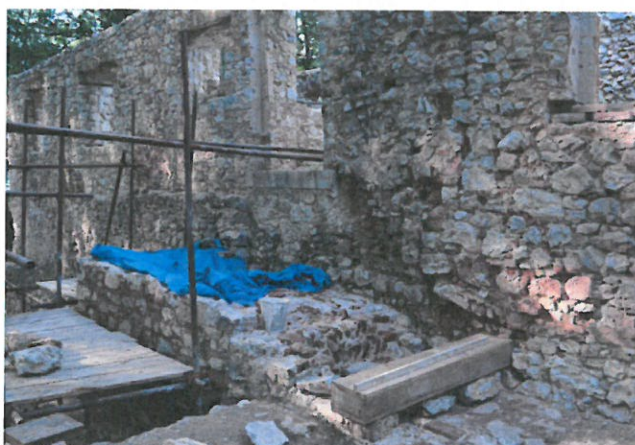



Schodisko domu veliteľa


Na tomto úseku sa podarilo odstrániť sutinu, očistiť a zakonzervovať pôvodné murivo, následne ho nadmurovať do plnej výšky. Vytvorila sa vnútornú klenbu nad sutinovým zásypom telesa, a neskôr vo vrchnej časti bola položená tehlová dlažba. K prácam patrila aj príprava tesaných nárožných kvádrov a stupňov schodiska. Na stupne schodiska sa muselo vytesať aj množstvo pravouhlých kameňov, čo bolo časovo náročné. Tento objekt bol prioritou, nakoľko práce priamo nadväzovali na iný projekt a to montáž strechy („Čiastočná revitalizácia a obnova ruiny hradu Muráň“ – Strecha domu veliteľa).

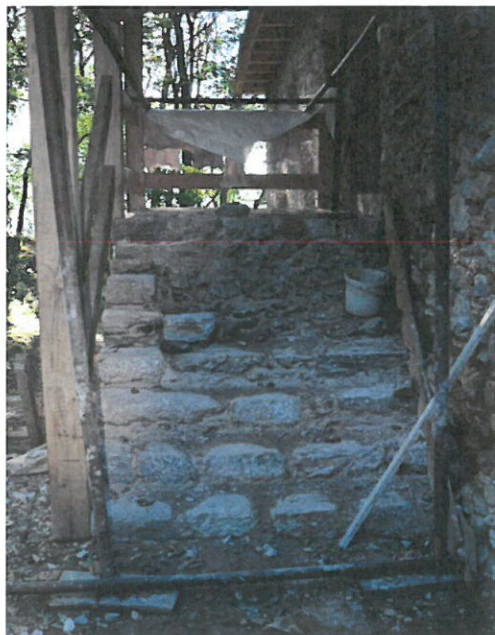

Ostatné práce na dome veliteľ'a

Podbitie na streche domu veliteľ'a bolo dokončené. Upravila sa menšia miestnosť v interiéri domu veliteľ'a. Zarovnala sa podlaha a pripravili sa stojky pre výdrevu (ramenát) menšej tehlovej klenby. Tá sa plánuje rekonštruovať v budúcej stavebnej sezóne. Pripravené boli aj ručne kresané zárubne a šambrány dverí a okien. Sú úplne dohotovené vrátane čapov, ale pre veľmi chladné počasie ich nebolo možné osadiť nastálo. Preto ich pracovníci projektu bezpečne uložili a osadia sa na jar.

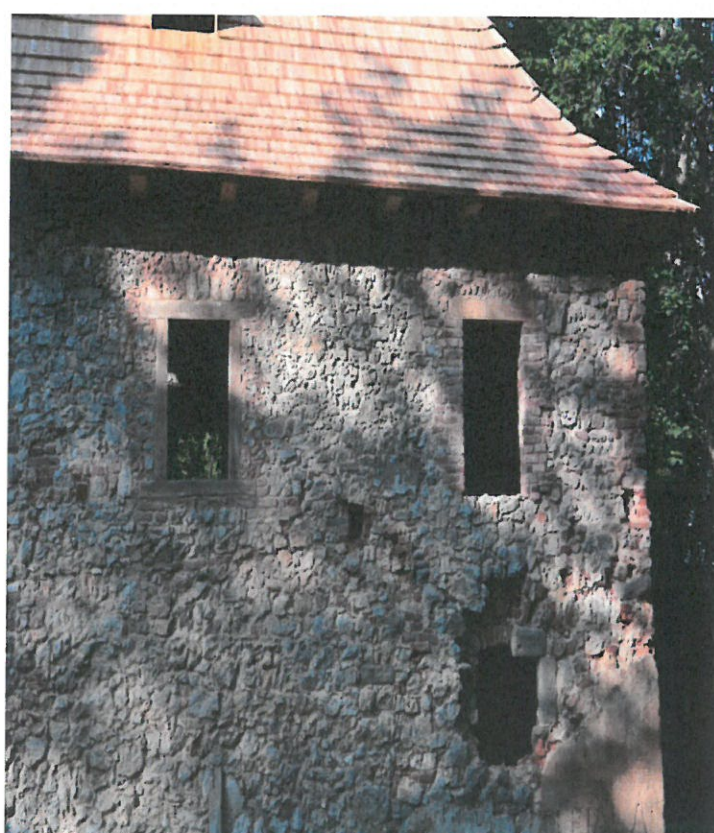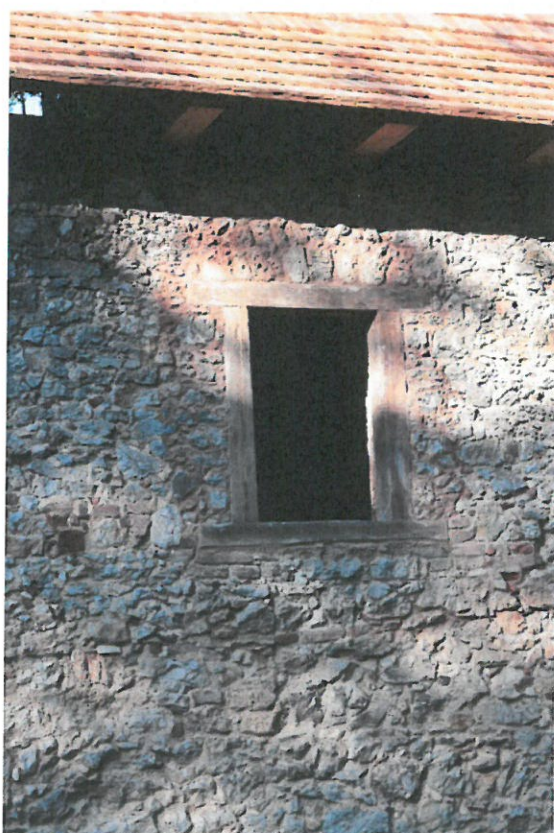

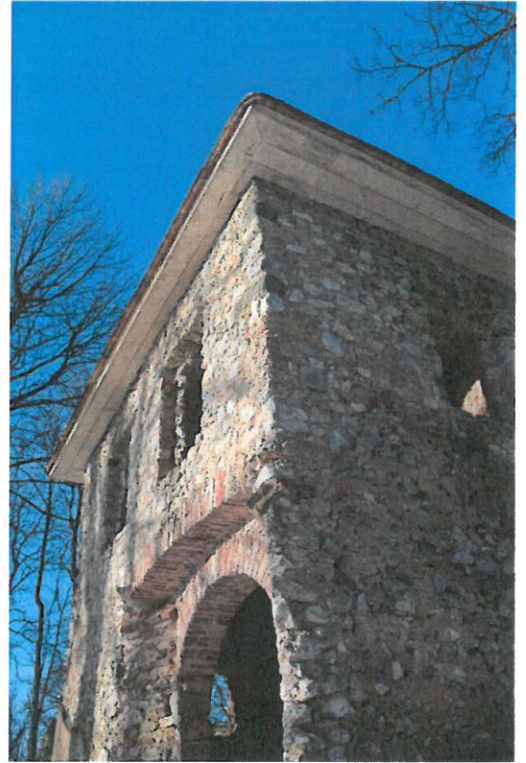

Dom zlatníka

Dom zlatníka

Dokončila sa stabilizácia najviac ohrozených častí a rekonštrukcia káps po drevených prvkoch.



Strielňa na pravej strane Bašových dverí

Strielňa na pravej strane Bašových dverí


Úprava svahu v okolí si vyžiadala premiestnenie veľkého množstva sutín cca 30 - 40 m³. Popritom sa vytriedil kameň vhodný na stavbu a odstránil sa koreň starého jaseňa v priemere 1,5 m. Ručne sa vyrábali drevené preklady strielne. Na tomto objekte bola potrebná stavba lešenia z vonkajšej strany z dôvodu doplnenia líca stavby. Pre zložitosť terénu bolo nutné vytvoriť terasy zo suchých múrikov a schodov. Ďalšie stavebné práce spočívali v podmurovaní vychýlenej časti múru na pravej strane, čím sa zabezpečila proti odtrhnutiu. Po tejto fáze nasledovalo osadenie drevených terasových prvkov a prekladov, ktoré boli predpripravené. Po osadení prekladov sa vyplnila kaverna nad strielňou a obe chýbajúce líca hradby.



Údržba areálu a ostatné práce

- Výnos dosiek a hranolov spod chaty do Domu veliteľa.
- Výroba nových lešenárskych podlážok, meranie a osadenie dosák na podhl'ad.
- Spracovanie spadnutého jaseňa na chodníku nad Koháryho palácom. Tiež
- Nosenie a rúbanie palivového dreva, aby bolo možné sa v mínusových teplotách zahriať.
- Výnos pitnej vody z prameňa pod hradom.
- Vykopanie novej jamy na latrínu v blízkosti Koháryho paláca.
- Odkopanie sutiny - upravený a vyspádovaný terén pre odtok dažďovej vody. Odkopaný materiál bol následne použitý na zasypávanie nerovností na hrade.
- Kamene používané pri murárskych prácach boli vyvezené traktorom a ručne vynosené.
- Medzi dôležité práce patrilo aj upratovanie interiéru a exteriéru stavby.
- Uhl'adávanie, čistenie a otesávanie penovcov a tehál v areáli hradu pre dostavbu klenieb.
- Výnos stavebného materiálu dosiek a piesku.
- Kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy z nádvorja hradu a z okolia turistických chodníkov.
- Pílenie a upratovanie popadaného dreva na chodníkoch. Drevo bolo sčasti spracované na stavebné účely (stojky ramenátov, hranoly a palivové drevo).
- Upratovanie materiálov zo stavebnej murárskej sezóny. Likvidácia prebytočného vápna (používalo sa na dezinfekciu latríny) Upratovanie hadíc a banerov na vodu. Celkové zazimovanie staveniska.
- Úprava terénu (Bašove dvere) - stavba oporných suchých múrikov a schodov.
- Pre náročnosť terénu a zimné počasie so snehom v posledných 2 mesiacoch k prácam pribudla údržba chodníkov (odpratávanie snehu a posypanie popolom).



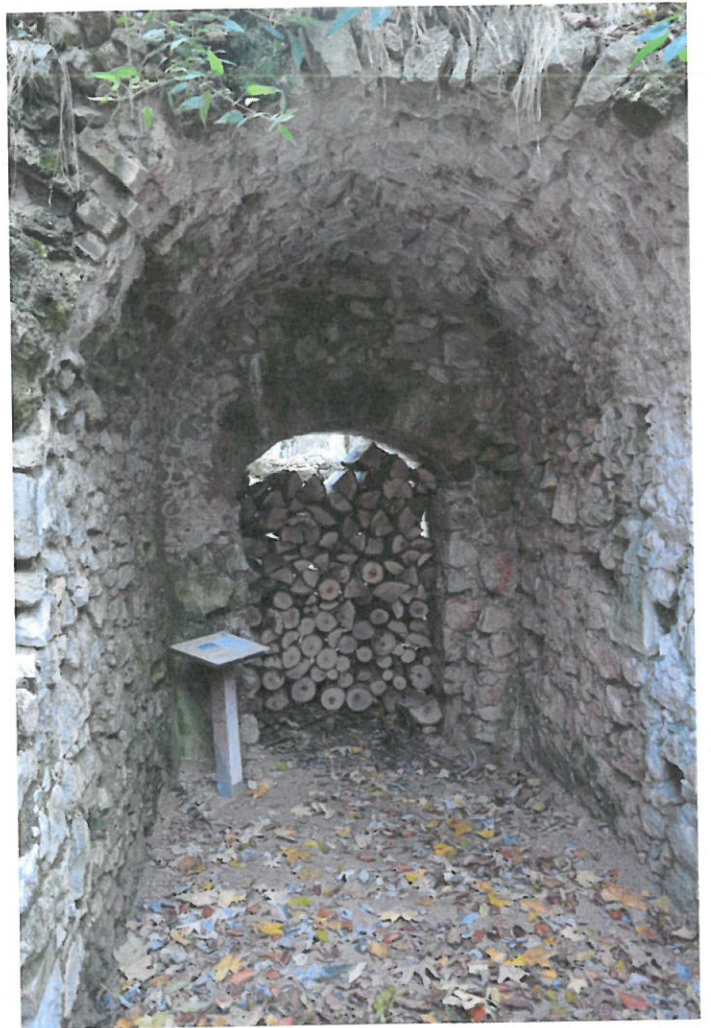





V Muráni 16.01.2024

Správu vypracoval: Viktor Šima

Za správnosť zodpovedá: Ing. Roman Goldschmidt – starosta obce Muráň

OBEC MURÁŇ
IČO: 328537
DIČ: 2020724717
049 01 MURÁŇ

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the mayor mentioned in the text.

